

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

NÚM. CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FISDMDF-034/2021

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **20** DEL MES DE **JULIO** DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN EL FRACCIONAMIENTO: **EL SURESTE SEGUNDA ETAPA** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL:

EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C.DAVID ERNESTO VILLA SANCHEZ**
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, C. CARLOS JIMENEZ CARRERA Y C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE SEGUNDA ETAPA" UBICADA EN LA CALLE 25 ORIENTE, (ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 2 SUR); CALLE 2 SUR (CALLE 25 ORIENTE Y CAMINO VIEJO AL AZUFRE), LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. EL SURESTE 2DA. ETAPA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. EL SURESTE 2DA. ETAPA)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2021.

RUBRO: URBANIZACION

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACION No. FISDMDF/MSJBT/20184/023/2021 DE FECHA: 24/03/2021

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FISDMDF-034/2021 FECHA: 26 de abril de 2021

CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 27 de abril de 2021 INICIO REAL: 27 de abril de 2021

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 10 de julio de 2021 TERMINACION REAL: 10 de julio de 2021

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE SEGUNDA ETAPA" UBICADA EN LA CALLE 25 ORIENTE, (ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 2 SUR); CALLE 2 SUR (CALLE 25 ORIENTE Y CAMINO VIEJO AL AZUFRE), LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. EL SURESTE 2DA. ETAPA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, PRELIMINARES, OBRA DE DRENAJE PLUVIAL, PAVIMENTO, BORDILLO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO.

METAS ALCANZADAS: 2914.28 M2 BENEFICIARIO: 160 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 3.631.215,31	\$ 3.627.661,52	\$ 3.627.661,52	\$ 3.627.661,52	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
TOTAL	\$ 3.631.215,31	\$ 3.627.661,52	\$ 3.627.661,52	\$ 3.627.661,52	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 1.088.298,46 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	2116247	26-abr-21	\$ 1.088.298,46	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
CUMPLIMIENTO	2116246	26-abr-21	\$ 362.766,15	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
VICIOS OCULTOS	2129034	20-jul-21	\$ 362.766,15	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	27-abr-21	26-may-21	\$1.468.471,93		\$ 1.468.471,93	\$ 234.955,51	\$ 1.703.427,44	\$ 511.028,23	\$ 7.342,36	\$ 5.297,74	\$ 1.179.759,11
02 (DOS)	27-may-21	25-jun-21	\$1.197.688,04		\$ 1.197.688,04	\$ 191.630,09	\$ 1.389.318,13	\$ 416.795,44	\$ 5.988,44	\$ 4.320,84	\$ 962.213,41
03 (TRES) FINIQUITO	26-jun-21	10-jul-21	\$461.134,44		\$ 461.134,44	\$ 73.781,51	\$ 534.915,95	\$ 160.474,79	\$ 2.305,67	\$ 1.663,61	\$ 370.471,88
TOTALES			\$3.127.294,41		\$ 3.127.294,41	\$ 500.367,11	\$ 3.627.661,52	\$ 1.088.298,46	\$ 15.636,47	\$ 11.282,19	\$ 2.512.444,40



V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.


LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

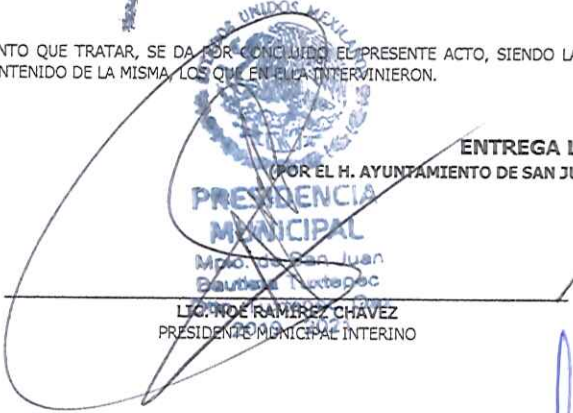

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
LITO RAMÍREZ CHÁVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



SINDICATURA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021
LIC. JUAN LUIS SÁNCHEZ MARÍN
SINDICO MUNICIPAL

TESTIGO



Tuxtepec
Gobierno Municipal 2019-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ING. ALFONSO CLARA ORTELA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2019-2021
CED. PROF. NO. 200390

RECIBE LA OBRA

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)



C.DAVID ERNESTO VILLA SÁNCHEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ



C. ROCELIA ESPINOZA MARTÍNEZ
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

L.C. JORGE PINEDA SAMACHO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL



Tuxtepec
Gobierno Municipal 2019-2021
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA



Tuxtepec
Gobierno Municipal 2019-2021
COMITÉ DE VECINOS
FRACC SURESTE
2º ETAPA
2019-2021
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

MARIO ALBERTO TENORIO
