

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**

**NÚM. CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-066/2020**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **4** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **PAPALOAPAN** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL:

EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:


PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAPALOAPAN", UBICADA EN LA AV. NICOLAS BRAVO (FRENTE A CALLE ABASOLO), LOCALIDAD DE PAPALOAPAN, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC  
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
LOCALIDAD: 0038 PAPALOAPAN

**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020. CUENTA PRESUPUESTAL:  
RUBRO: AGUA POTABLE  
OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/051/2020 DE FECHA: 19 de agosto de 2020  
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-066/2020 FECHA: 25 de septiembre de 2020  
CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A  
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 28 de septiembre de 2020 INICIO REAL: 28 de septiembre de 2020  
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 26 de noviembre de 2020 TERMINACION REAL: 26 de noviembre de 2020

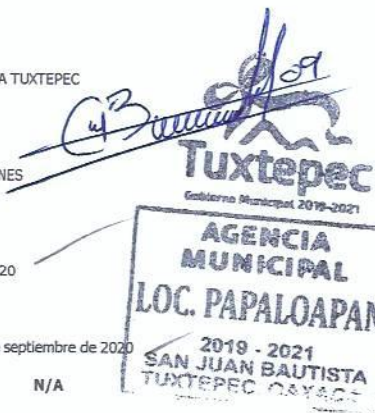

**DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:**

PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAPALOAPAN", UBICADA EN LA AV. NICOLAS BRAVO (FRENTE A CALLE ABASOLO), LOCALIDAD DE PAPALOAPAN, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.


DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, PERFORACION EN 12 1/4" EN ETAPA DE EXPLORACION, AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12 1/4" -22", AMPLIACION DE 12 -34, SUMINISTRO DE TUBERIA, COLOCACION DE TUBERIA, TRABAJOS DE LIMPIEZA, AFORO, TRABAJOS FINALES.

METAS ALCANZADAS: 1.00 POZO BENEFICIARIO: 2302 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,857,927.90	\$ 1,855,425.15	\$ 1,855,425.15	\$ 1,855,425.15	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,857,927.90</b>	<b>\$ 1,855,425.15</b>	<b>\$ 1,855,425.15</b>	<b>\$ 1,855,425.15</b>	<b>\$ -</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 556,627.55

INCLUYE I.V.A. 

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	1249-01531-2	25-sep-20	\$ 556,627.55	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	1249-01532-3	25-sep-20	\$ 185,542.52	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	1249-01607-0	04-dic-20	\$ 185,542.52	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	28-sep-20	27-oct-20	\$1,122,655.30	\$ -	\$ 1,122,655.30	\$ 179,624.85	\$ 1,302,280.15	\$ 390,684.05	\$ 5,613.28	\$ 2,194.17	\$ 903,788.65
02 (DOS)	28-oct-20	26-nov-20	\$476,849.14	\$ -	\$ 476,849.14	\$ 76,295.86	\$ 553,145.00	\$ 165,943.50	\$ 2,384.25	\$ 931.97	\$ 383,885.28
FINIQUITO											
<b>TOTALES</b>			<b>\$1,599,504.44</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,599,504.44</b>	<b>\$ 255,920.71</b>	<b>\$ 1,855,425.15</b>	<b>\$ 556,627.55</b>	<b>\$ 7,997.53</b>	<b>\$ 3,126.14</b>	<b>\$ 1,287,673.93</b>

**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.


LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU FIRMA, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE SE ENVIARON.


**ENTREGA LA OBRA:**  
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 LIC. NOE GARCÍA STAVEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO


  
**SINDICATURA HACENDARIA**  
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019-2021  
 LIC. LIZ ORLANDA MARTINEZ CUMPLIDO  
 SINDICO HACENDARIA


**TESTIGOS**

  
**REGIDORÍA DE OBRAS PUBLICAS**  
 BIOL. VICENTE MORALES BANCHEZ  
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021

  
 ING. ALFONSO CLARA ORTELA  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**RECIBE LA OBRA**  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

  
Samuel Hernandez Nieves  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

  
Berenice Hernandez Cano  
 SECRETARIO DEL COMITÉ


Lic. Omar de Jesus Licona Aguilera.

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

  
**Tuxtepec**  
 L.C. JORGE PINEDA OSMACHO  
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL

**Tuxtepec**  
 Gobierno Municipal 2019-2021  
**AGENCIA MUNICIPAL**  
**LOC. PAPALOAPAN**  
 2019 - 2021  
 SAN JUAN BAUTISTA  
 TUXTEPEC

(POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL)

  
**ORGANISMO INTERNO DE CONTROL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021  
Carlos Jimenez Camero  
MARIO AUBERTO TEWORIO

**Tuxtepec**  
 Gobierno Municipal 2019-2021  
**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
 SAN JUAN BAUTISTA  
 TUXTEPEC, OAXACA
